

Route 2022

update nav uitstel tot 1-7-2022

Roadmap voor de veiligheidsregio's tot de inwerkingtreding
Omgevingswet op 1-7-2022

Versie 2

Route 2022 veiligheidsregio's

De Roadmap (Route 2022) is een-op-een afgeleid van de Route 2022 voor de gemeenten. Deze is opgesteld door de VNG. Aansluiting van de roadmap van de veiligheidsregio's op die van de VNG is randvoorwaardelijk om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet per 1-7-2022 .

De roadmap beschrijft mijlpalen. Per mijlpaal wordt aangegeven welke acties een veiligheidsregio moet uitvoeren. De detailplanning is afhankelijk van de specifieke situatie in de regio.

Deze roadmap is ook van toepassing op de GHOR.





01-07-2020

01-01-2021

01-07-2021

01-01-2022

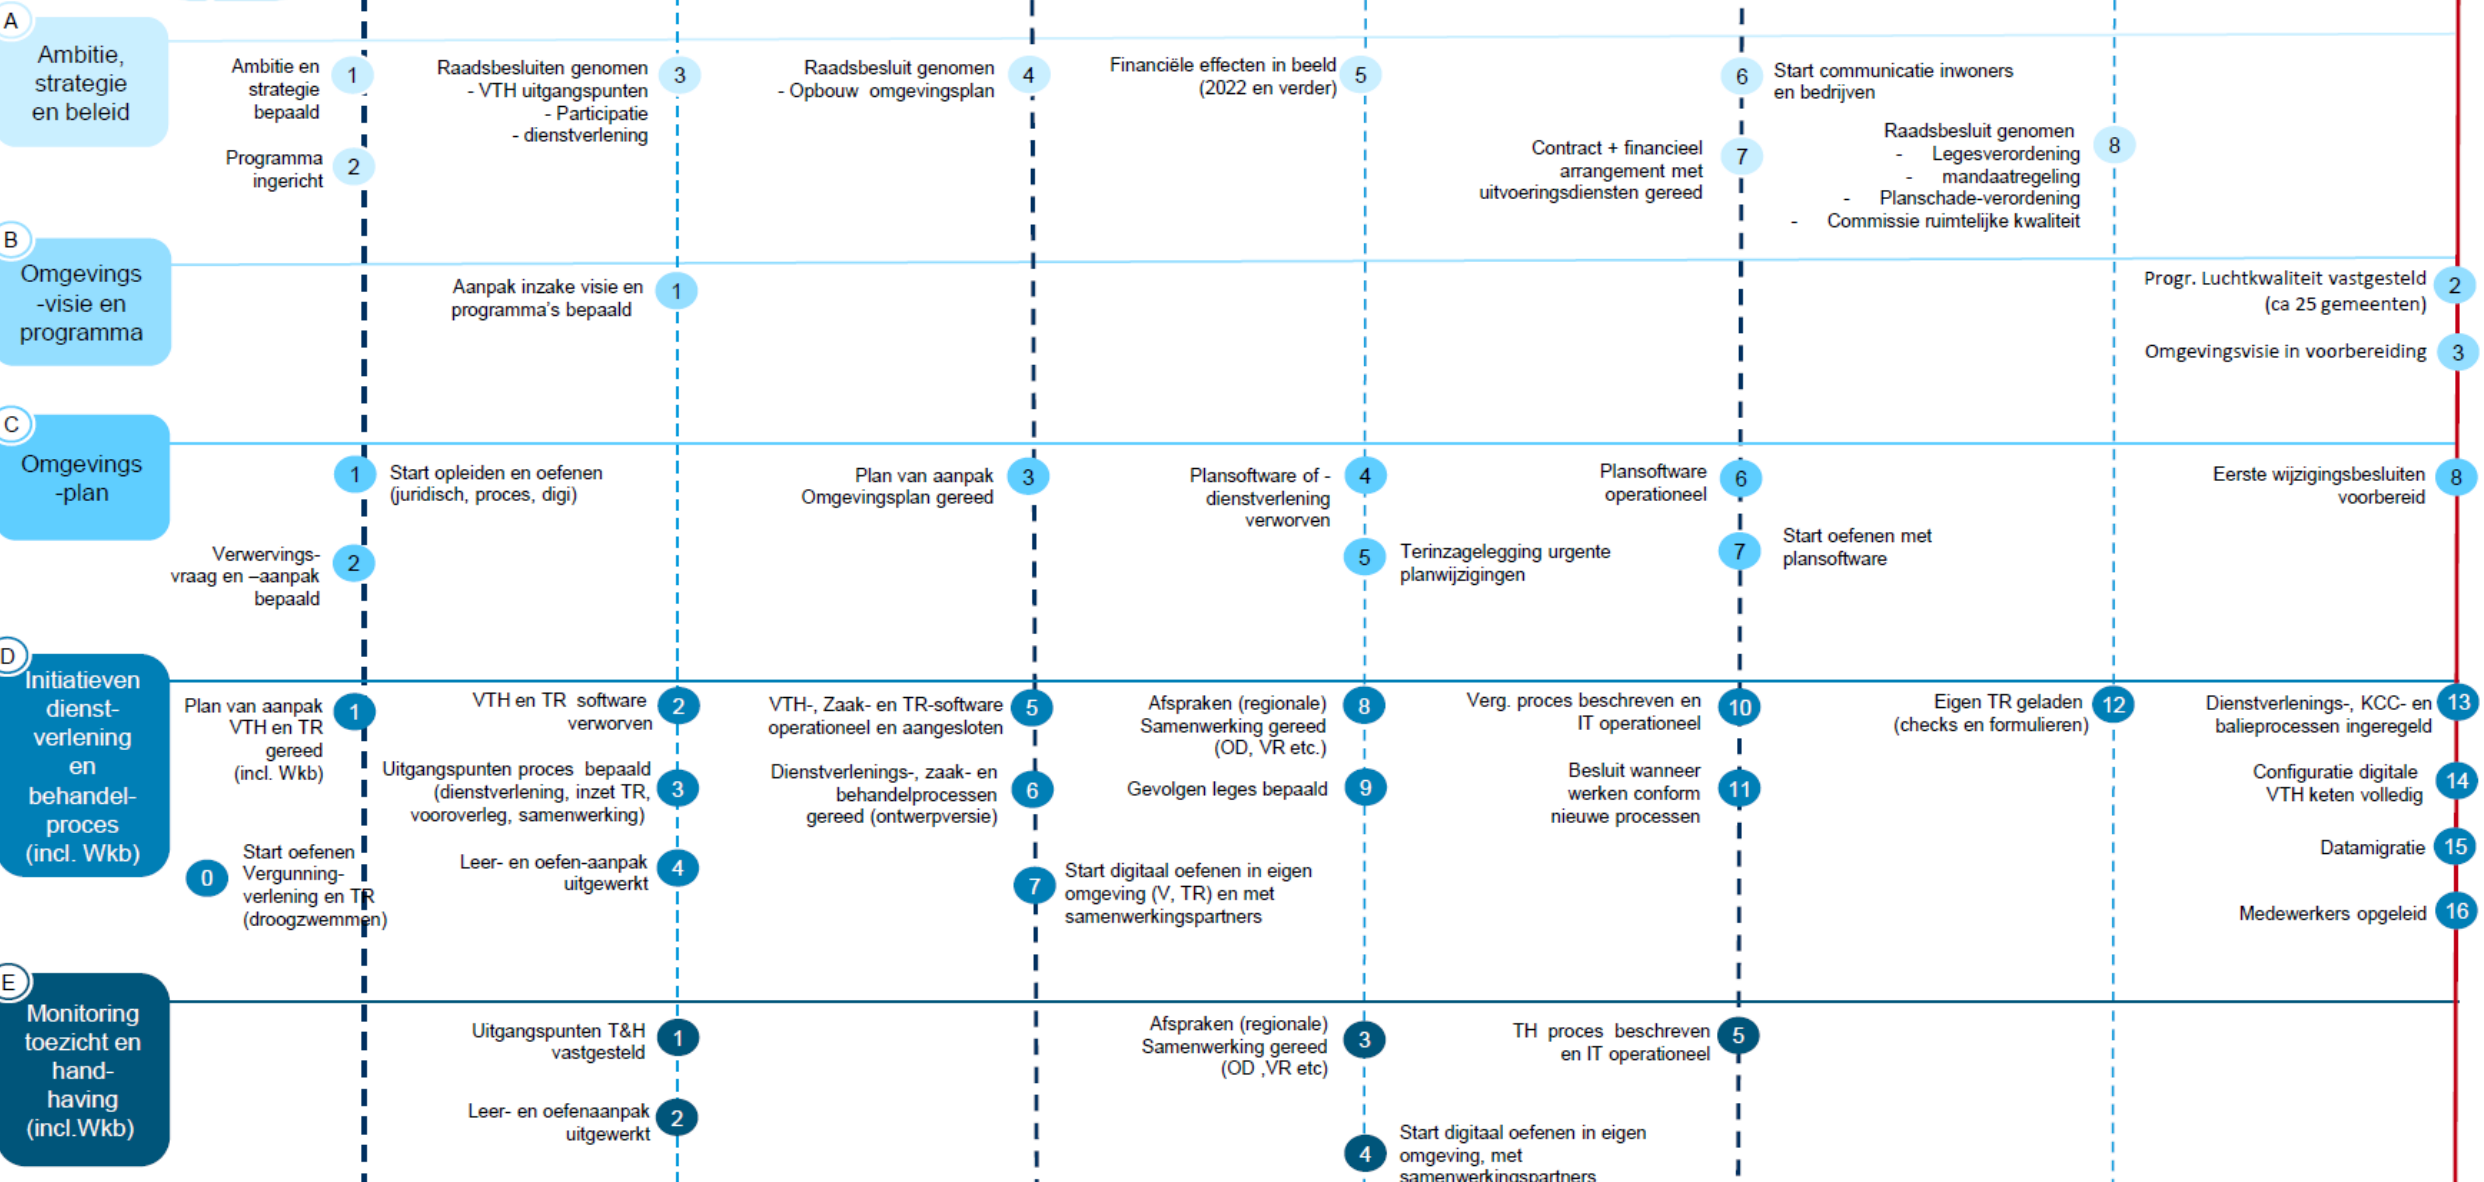

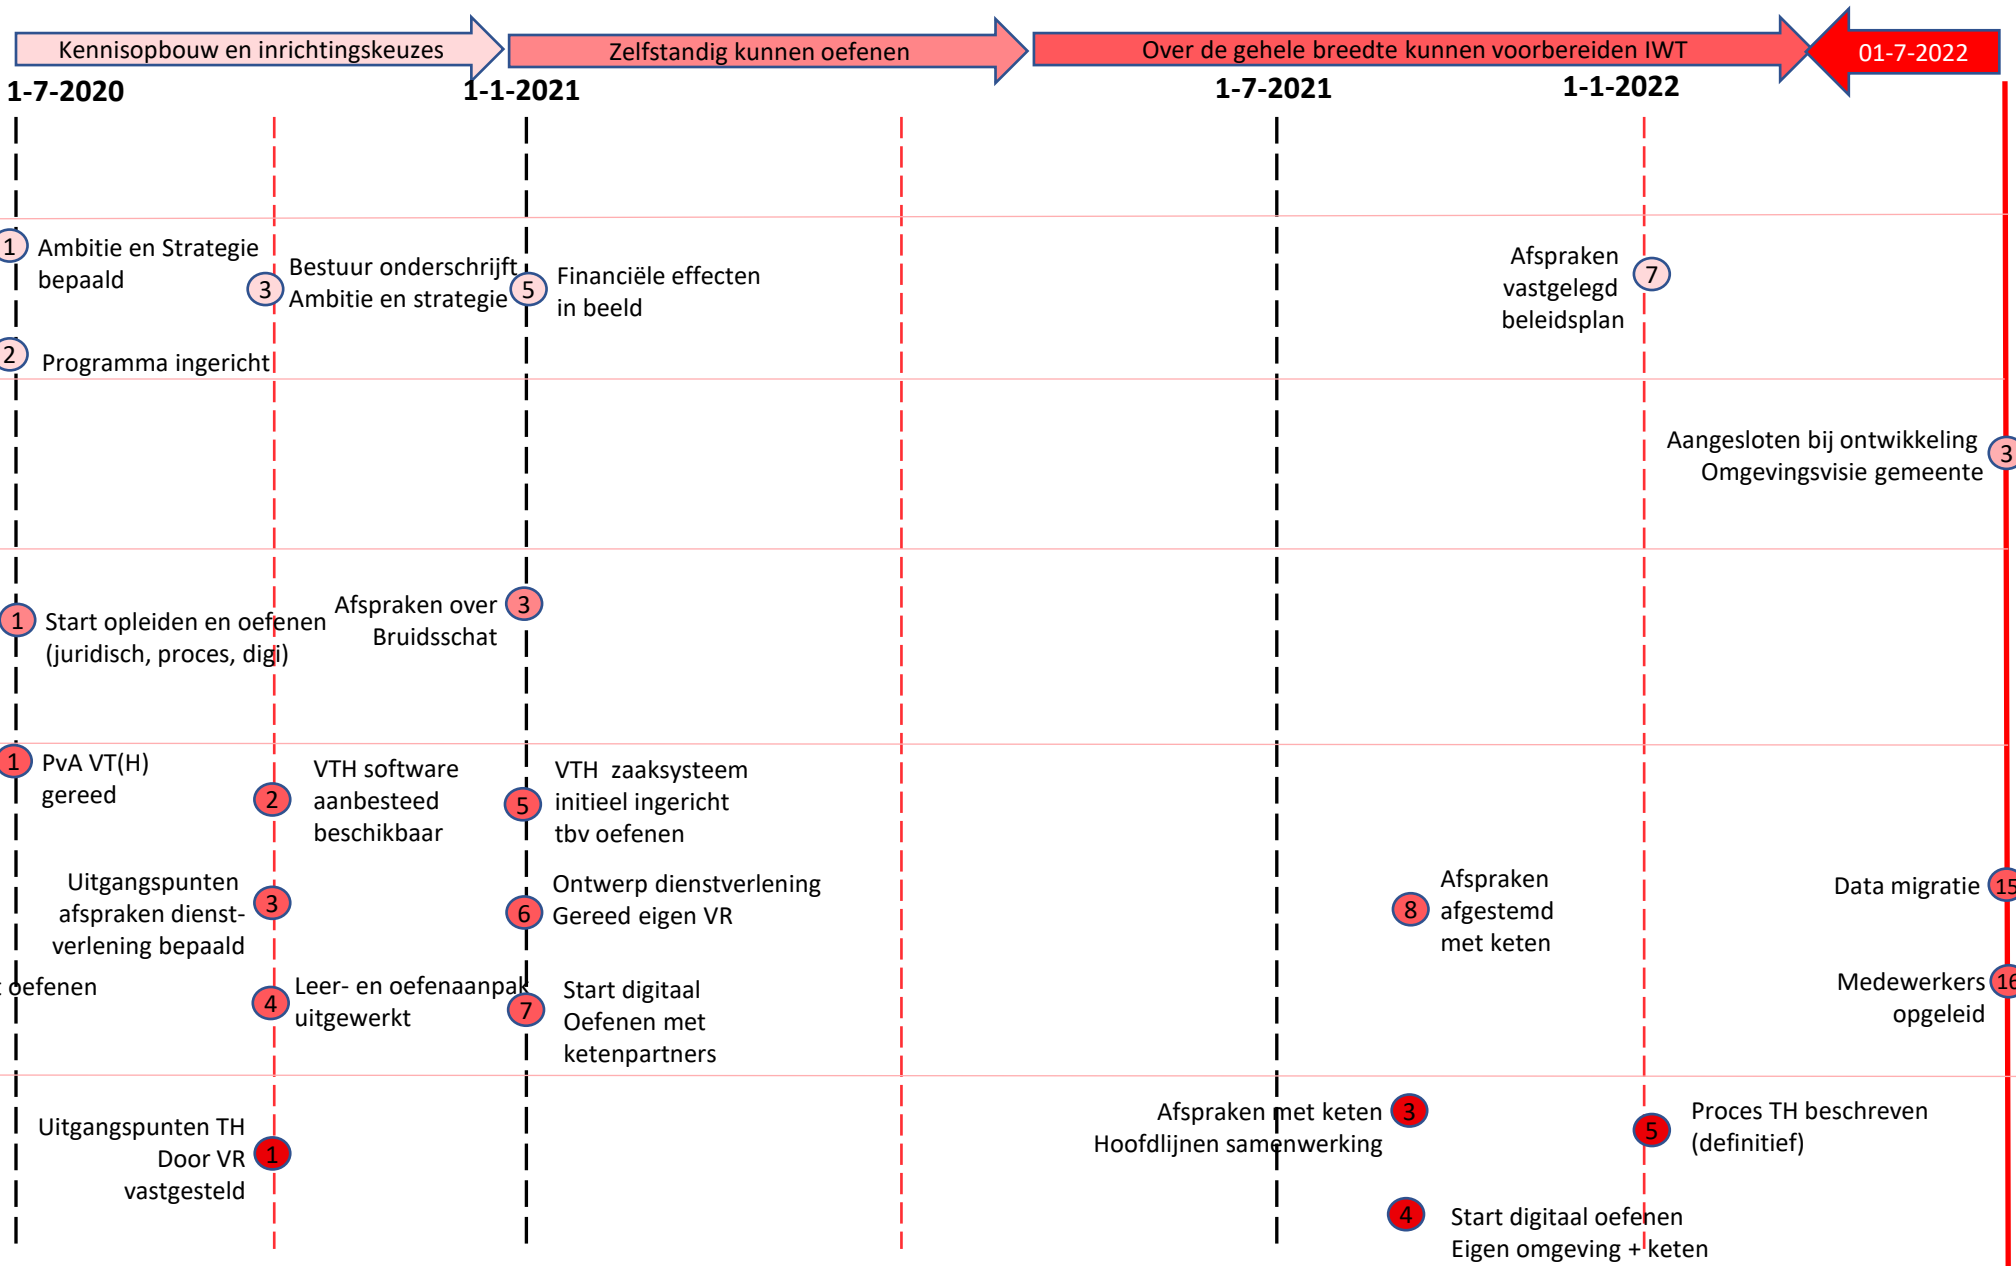

Toelichting spoor A-B-C



Nummer	Mijlpaal gemeente	Mijlpaal VR	Toelichting
A1	Ambitie en strategie bepaald	Ambitie en strategie bepaald	Een veiligheidsregio heeft grofweg 3 keuzes: 1. OW is een kans en wordt gebruikt om toch al gewenste verbeteringen door te voeren 2. Doen wat minimaal gedaan moet worden. Vanuit de OW is dat beperkt, vanuit de eigen ambitie kan gedacht worden aan handhaven huidig kwaliteitsniveau 3. Niets doen: 'het loopt zo'n vaart nog niet'. VR volgt de vraag vanuit gemeenten. In de praktijk worden op verschillende onderwerpen verschillende ambities uitgesproken. Deze vormen de uitgangspunten voor verdere inrichting (en financiering)
A2	Programma ingericht	Programma ingericht	Veiligheidsregio's hebben het programma voor de invoering van de Omgevingswet ingericht (afbakening opgave/opdracht, aanpak, bemensing, financiering, planning, voortgangsbewaking). Stel een kwartiermaker aan.
A3	Raadsbesluiten genomen	Bestuur onderschrijft Ambitie en strategie	Zonder draagvlak van het bestuur en eventueel financiering kan het lastig worden de gewenste ambitie te realiseren.
A5	Financiële effecten in beeld	Financiële effecten in beeld	De financiële consequenties voor de veiligheidsregio's van invoering van de OW zijn (nog) niet bekend. Minder vergunningen en meer meldingen betekent minder lege-inkomsten. Gebruik de uitkomst van het (lopende) onderzoek door Cebeon als start voor een discussie over financiering en neem deze mee in de begrotingscyclus.
A7	Contract + financieel arrangement met uitvoerings	Afspraken met de gemeenten vastgelegd in beleidsplan	De OW verplicht om aan te geven op welke wijze de VR een bijdrage levert aan het omgevingsplan. Dit is een krachtig en juridisch instrument om invloed uit te oefenen op een fysiek veilige leefomgeving. Concreet: leg de taakuitvoering vast in het beleidsplan.
B3	Omgevingsvisie in voorbereiding	Aangesloten bij ontwikkeling Omgevingsvisie gemeente	De verplichting voor gemeenten om een gebiedsdekkende omgevingsvisie te hebben geldt vanaf 1-1-24. De doorlooptijd voor het opstellen van een omgevingsvisie en de besluitvorming is echter vaak lang. Daarom wordt gemeenten geadviseerd hier uiterlijk eind 2021 te beginnen en per 1-1-2022 wezenlijke stappen te hebben gezet. Overleg met de gemeente wanneer en op welke wijze een bijdrage geleverd kan worden aan het opstellen van een Omgevingsvisie.
C1	Start opleiden en oefenen	Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi)	'Droog oefenen' met het omgevingsplan is mogelijk. Gemeenten verdiepen zich samen met de VR in de vraagstukken die spelen bij het opstellen van een omgevingsplan en gaan oefenen met het opstellen van een stukje plan. Daarin worden ideeën uitgewerkt over de gewenste structuur van het plan en de regels daarin. Op basis van deze ervaringen en de instrumenten van de IFV, zoals het document "Bouwstenen fysieke veiligheid in het omgevingsplan", kan nagedacht worden over de gewenste vervolgstappen en het tempo voor de opbouw van het omgevingsplan na inwerkingtreding van de wet. Het samen met gemeenten oefenen van digitale samenwerking kan al starten (ook als het eigen zaakstelsel nog niet is aangesloten op DSO-SWF).
C3	Eerste wijzigingsbesluiten voorbereid	Afspraken over bruidsschat	Met de komst van de OW worden een aantal huidige wetgeving/artikelen overgedragen aan gemeenten. Een aantal hiervan zijn relevant voor de veiligheidsregio. Denk aan het artikel rond bluswater. Het is belangrijk met de gemeenten afspraken te maken op welke wijze hierover met de brandweer wordt afgestemd en de brandweer rekening kan houden met eventuele wijzigingen. Op dit moment wordt de bruidsschat voor de veiligheidsregio's uitgewerkt.

Toelichting spoor D (1/2)

Initiatieven diensteverlening en behandelproces



Nummer	Mijlpaal gemeente	Mijlpaal VR	Toelichting
D0	Start oefenen vergunningverlening en TR (droogzwemmen)	Start oefenen VTH	Om bekend te raken met de nieuwe werkwijze en wat dat betekent voor afspraken met de ketenpartners is het goed om 'droog' te oefenen: nog zonder gebruik te maken van systemen (die volgen later) en vaak abstracter en met casussen. Vaak samen met ketenpartners als gemeenten.
D1	Plan van aanpak VTH en TR gereed (incl. Wkb)	PvA mbt Vergunningverlening en Toezicht/WkB gereed	Er is een plan van aanpak bij VR voor de invoering van nieuwe VT(H)-processen (inclusief Wkb) vanaf 1-1-2022. Het PvA kent een heldere resultaatbeschrijving, tussenschappen en benoemt afhankelijkheden en risico's, inclusief momenten voor bestuurlijke besluitvorming, verwerving software. Een goede leidraad hierbij is de VR actielijst. Tevens is aangegeven welke IFV instrumenten gebruikt worden.
D2	VTH en TR software verworven	VTH software verworven (aanbesteed) en beschikbaar.	Deze mijlpaal beschrijft het moment waarop de software die wordt gebruikt om te koppelen met de DSO-samenwerking Functionaliteit (SWF) is verworven (uit aanbesteding) en technisch geïmplementeerd. Deze hoeft nog niet ingericht te zijn (gevuld met de zaaktypen en PDC) en de technische koppeling met SWF hoeft nog niet gerealiseerd te zijn.
D3	Uitgangspunt proces bepaald	Uitgangspunten afspraken dienstverlening bepaald	De uitgangspunten voor administratieve en dienstverleningsprocessen zijn bepaald. Dat houdt in dat voor het vergunning proces een aantal keuzes zijn gemaakt die het minimumniveau moeten borgen, uitgangspunten voor het vooroverleg of omgevingsoverleg zijn bepaald en basiskeuzes voor digitale en samenwerkingsprocessen zijn bepaald. Ook de contouren voor de samenwerking met de gemeente zijn besproken. Ook de eerste beschrijving van Wkb processen zijn uitgewerkt, bij voorkeur op basis van leerervaringen uit proefprojecten.
D4	Leer en oefenaanpak uitgewerkt	Leer- en oefenaanpak uitgewerkt	Een aanpak is uitgewerkt waarin het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgewerkt en waarin casussen zijn opgenomen om ervaring met de Omgevingswet op te gaan doen. Dit betreft ook samenwerking met andere partijen.
D5	VTH-, zaak- en TR-software operationeel en aangesloten op VR	VTH software (zaaksysteem) initieel ingericht tbv oefenen	De in D2 genoemde VTH software/zaaksysteem is initieel ingericht: dwz basisprocessen (zaaktypen) zijn ingericht en er bestaat een technische koppeling met de Samenwerkingsomgeving (SWF). Afspraken over Archivering en uifaseren OLO zijn gemaakt.
D6	Dienstverlenings- zaak en behandelprocessen gereed voor eigen VR	Afspraken over dienstverlening (product en proces) ontwerp gereed voor eigen VR	De dienstverlening van de veiligheidsregio aan de ketenpartners zijn vastgelegd in de Producten Diensten Catalogus (PDC). Daaraan gekoppeld is de 'Zaaktype Catalogus (ZTC).

Toelichting spoor D (2/2)

Initiatieven diensteverlening en behandelproces



Nummer	Mijlpaal gemeente	Mijlpaal VR	Toelichting
D7	Start digitaal oefenen in eigen omgeving (V, TR)	Start digitaal oefenen in eigen omgeving met samenwerkingspartners	VR, gemeenten en samenwerkingspartners beschikken over de software die (in de basis) ook bedoeld is om mee in werking te treden. De software ondersteunt in basis ook de uitvoering van de Wkb. De basisprocessen voor vergunningverlening, meldingen en informatieplichten en samenwerkingsafspraken zijn geïmplementeerd in de software en er kan nu echt digitaal worden geoefend en geleerd. Processen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
D8	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, V)	Afspraken over dienstverlening (product en proces) afgestemd met gemeente, provincie en OD	De VR heeft formele afspraken gemaakt met regionale ketenpartners. De samenwerking in de oefenperiode draagt hier aan bij. De afspraken zijn vastgelegd in een PDC.
D15	Datamigratie	Datamigratie	Als de VR een nieuw vergunningsstelsel heeft geïmplementeerd zullen (indien daartoe is besloten) de lopende VTH-zaken moeten worden overgezet van het oude naar het nieuwe systeem. Informatie in het oude systeem zal gearchiveerd moeten worden. Ook moet de VR toegang hebben tot alle gegevens die nodig zijn voor het werkproces. Concreet aansluiting op het nieuwe register EV eventueel via de risicokaart of Geo4OOV. Regionaal kan in een aantal gevallen worden aangesloten op regionale initiatieven waarbij een Omgevingswet-datawarehouse wordt ingericht. Informeer bij de eigen ketenpartners naar deze initiatieven.
D16	Medewerkers opgeleid	Medewerkers opgeleid	Ca. drie maanden voor inwerkingtreding zijn de VTH-medewerkers opgeleid om te werken volgens de Omgevingswet. Dat houdt onder meer in: basiskennis van de wet en de instrumenten van de wet. Specifieke kennis van VTH onder de Omgevingswet en van de processen en samenwerkingsafspraken die gelden voor de VR. En een knoppencursus voor het werken met het nieuwe systeem

Toelichting spoor E: Monitoring Toetsing Handhaving (WkB)

Spoor A
Ambitie, strategie en beleid

Spoor B
Omgevingsvisie en programma

Spoor C
Omgevingsplan

Spoor D
Initiatieven diensteverlening en behandelproces

Spoor E
Monitoring Toezicht en Handhaving

Nummer	Mijlpaal gemeente	Mijlpaal VR	Toelichting
E1	Uitgangspunten T&H vastgesteld	Uitgangspunten Toezicht en handhaving voor de VR vastgesteld	Aanvullend op D3 zijn specifieke uitgangspunten voor TH vastgesteld: hoe gaat de VR werken nu meer processen vergunningsvrij zijn en wat betekent dit voor de informatievoorziening en de medewerkers. Er is specifiek aandacht voor het Wkb proces, inclusief meldingen, informatie- en stopmomenten
E3	Afspraken (regionale) samenwerking gereed (OD, \ VR heeft afspraken gemaakt op hoofdlijnen over de regionale samenwerking met de VR		Samenwerkingsafspraken in regionaal verband zijn gemaakt met gemeenten, provincie, omgevingsdienst. Het gaat dan o.a. over betrokkenheid bij het omgevingsoverleg, het samenwerken aan toepasbare regels en vergunningaanvragen.
E4	Start digitaal oefenen in eigen omgeving, met sam	De VR start start met het digitaal oefenen in eigen omgeving met samenwerkingspartners	Deze mijlpaal is gelijk aan oefenen VTH systeem (TH=Toezicht/Handhaving) maar start later.
E5	TH proces beschreven en IT operationeel	De VR heeft het proces Toezicht en handhaving voor de VR bescheven	Het werkprocessen Toezicht en Monitoring is beschreven in de PDC en de afspraken met ketenpartners hierover zijn formeel vastgelegd. Deze mijlpaal is gelijk aan D8 maar start later in verband met de Wkb.

Ondersteuning veiligheidsregio's

Instrumenten en producten:

- [Generieke PDC/ZTC veiligheidsregio's](#) (meer info: Guus Welter)
- [Generiek PvE aanbesteding zaaksysteem](#) (meer info: Guus Welter)
- [Workshop scenario's samenwerking](#) (meer info: Guus Welter)
- [Bouwstenen fysieke veiligheid in Omgevingsplan](#) (meer info: Menno de Jonge)
- [FAQ DSO](#) (meer info: Guus Welter)
- [Onderzoek financiële consequenties](#) (Cebeon, meer info: Marijke Besselink)
- [Impactanalyse Omgevingswet \(M&I partners\)](#) (meer info: Guus Welter)
- [Omgevingswetspel veiligheidsregio's](#) (meer info: Marijke Besselink)
- Opleidingen IFV (meer info: Marijke Besselink)
- [Loket Omgevingsrecht](#) (meer info: Marijke Besselink/Guus Welter)
- [Bruidsschat in relatie tot veiligheidsregio's](#) (meer info: Marijke Besselink)
- [Route2022 veiligheidsregio's](#) (meer info: Guus Welter/Marijke Besselink)
- Bestuurlijke Awareness (in ontwikkeling, Marijke Besselink)
- [Gegevens opslag gevaarlijke stoffen](#) (Drempelwaarden RRGs/REV, Guus Welter)
- [Loket Omgevingsrecht](#) (meer info: Marijke Besselink/Guus Welter)

Relatie met actielijst veiligheidsregio

Nummer	Mijlpaal VR	Relatie met Actielijst Veiligheidsregio's
A1	Ambitie en strategie bepaald	1.Opstellen regionale visie Fysieke veiligheid
A2	Programma ingericht	
A3	Bestuur onderschrijft Ambitie en strategie	
A5	Financiële effecten in beeld	7.Reserveren Budget voor invoeren Omgevingswet
A7	Afspraken met de gemeenten vastgelegd in beleidsplan	2.Opnemen paragraaf in het beleidsplan
B3	Aangesloten bij ontwikkeling Omgevingsvisie gemeente	2.Opnemen paragraaf in het beleidsplan
C1	Start opleiden en oefenen (juridisch, proces, digi)	4.Pilots ketenpartners (ook informatievoorziening/uitwisseling)
C3	Afspraken over bruidsschat	5.Afstemmen Bruidsschat met gemeente
D0	Start oefenen VTH	4.Pilots ketenpartners (ook informatievoorziening/uitwisseling)
D1	PvA mbt Vergunningverlening en Toezicht/WkB gereed	
D2	VTH software verworven (aanbesteed) en beschikbaar.	8.Inrichten zaakstelsel (SWF functionaliteit) + afspraken leverancier aansluiting DSO
D3	Uitgangspunten afspraken dienstverlening bepaald	3.Afspraken gemeente proces vooroverleg/omgevingstafels
D4	Leer- en oefenaanpak uitgewerkt	6.Opleiden en bijscholen medewerkers.
D5	VTH software (zaakstelsel) initieel ingericht tbv oefenen	9.Inrichten/afspraken samenwerkingsomgeving 11.Uitfaseren OLO 12.Inregelen Archivering onder DSO
D6	Afspraken over dienstverlening (product en proces) ontwerp gereed voor eigen VR	8.Inrichten zaakstelsel (SWF functionaliteit) + afspraken leverancier aansluiting DSO
D7	Start digitaal oefenen in eigen omgeving met samenwerkingspartners	4.Pilots ketenpartners (ook informatievoorziening/uitwisseling)
D8	Afspraken over dienstverlening (product en proces) afgestemd met gemeente, provincie en OD	3.Afspraken gemeente proces vooroverleg/omgevingstafels
D15	Datamigratie	8.Inrichten zaakstelsel (SWF functionaliteit) + afspraken leverancier aansluiting DSO 10.Organiseren beschikbaarheid gegevens (evt aanhaken regionale datawarehouses)
D16	Medewerkers opgeleid	6.Opleiden en bijscholen medewerkers.
E1	Uitgangspunten Toezicht en handhaving voor de VR vastgesteld	
E3	VR heeft afspraken gemaakt op hoofdlijnen over de regionale samenwerking met VR	
E4	De VR start met het digitaal oefenen in eigen omgeving met samenwerkingspartners	
E5	De VR heeft het proces Toezicht en handhaving voor de VR bescheven	
